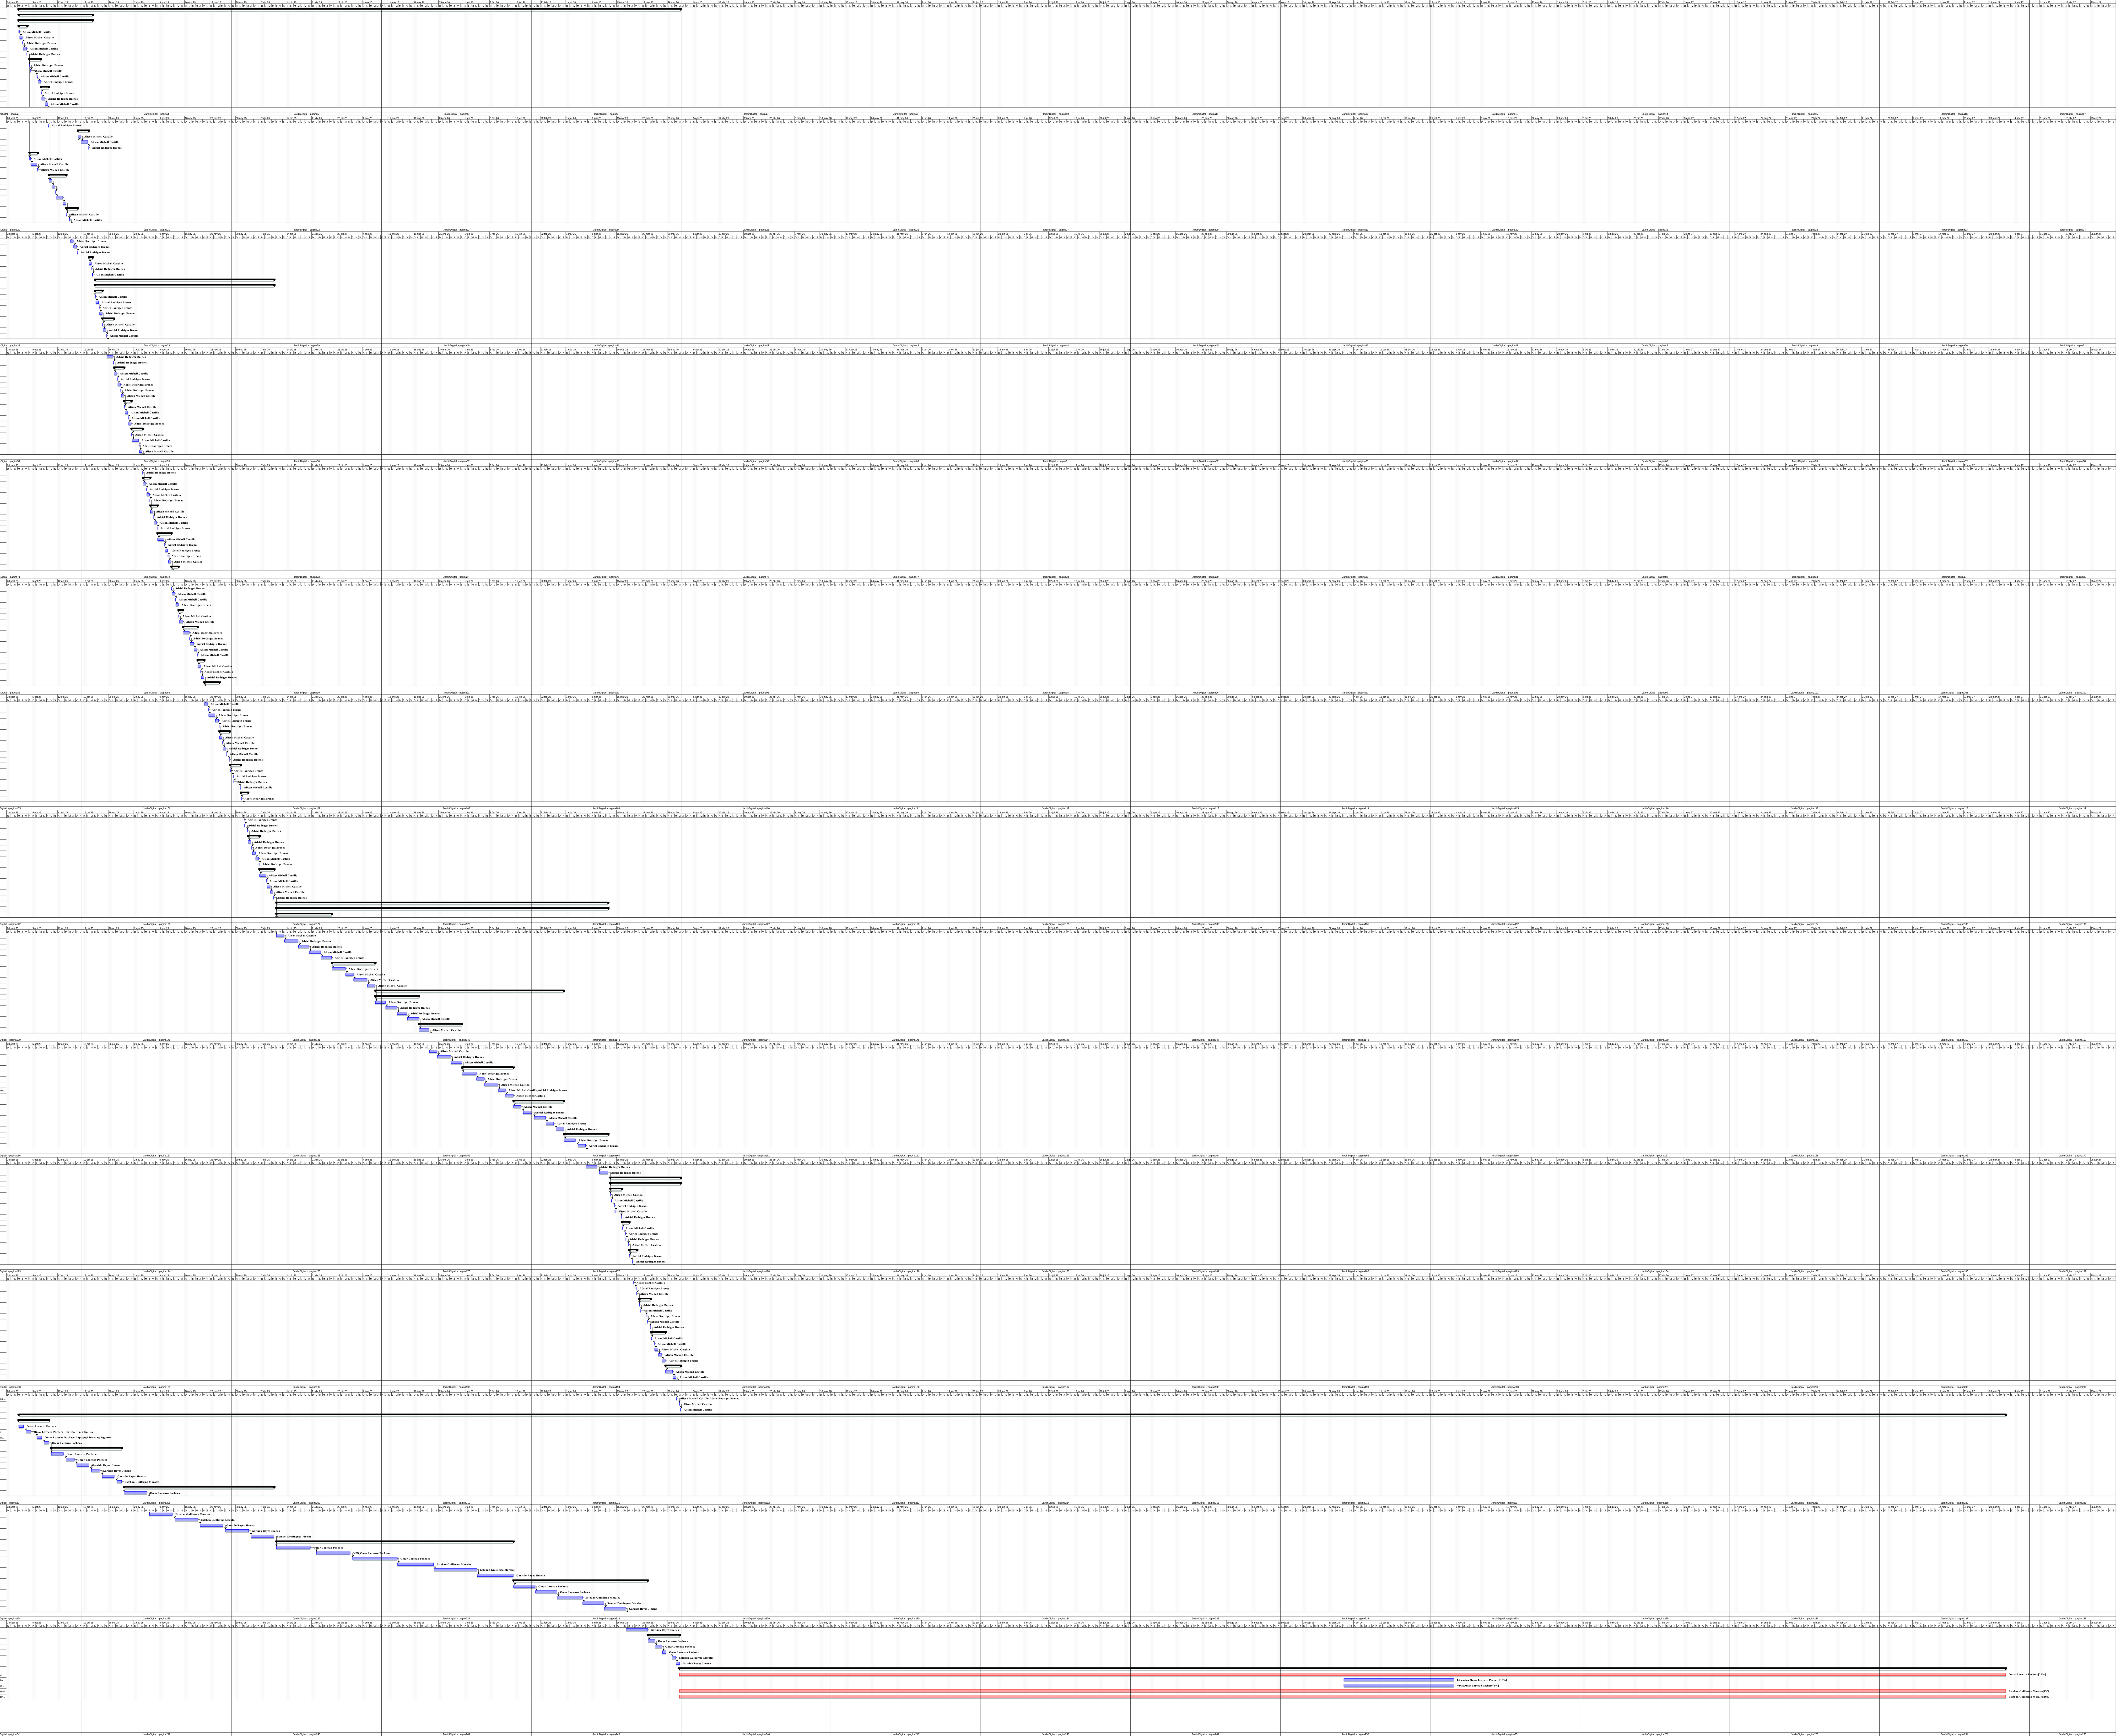	ⓘ	WBS	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Inicio real	Fin real	Porcentaje completo	Predecesores	Nombres del Recurso
1		**1**	**Ciclo de vida del proyecto**	**157 days?**	**01/10/25, 08:00**	**01/04/26, 17:00**			**0 %**		
2		**1.1**	**Inicio**	**18 days**	**01/10/25, 08:00**	**21/10/25, 17:00**			**0 %**		
3		**1.1.1**	**Documentación de la e...**	**18 days**	**01/10/25, 08:00**	**21/10/25, 17:00**			**0 %**		
4		**1.1.1.1**	**Acta de consitucion ...**	**3 days**	**01/10/25, 08:00**	**03/10/25, 17:00**			**0 %**		
5		1.1.1.1.1	Evaluar las entradas ...	0.7 days	01/10/25, 08:00	01/10/25, 14:36			0%		Alison Michell Castillo
6		1.1.1.1.2	Consultar a expertos ...	0.5 days	01/10/25, 14:36	02/10/25, 09:36			0%	5	Alison Michell Castillo
7		1.1.1.1.3	Utilizar Técnicas de F...	0.5 days	02/10/25, 09:36	02/10/25, 14:36			0%	6	Adriel Rodrigez Brenes
8		1.1.1.1.4	Documentar los Elem...	0.8 days	02/10/25, 14:36	03/10/25, 13:00			0%	7	Alison Michell Castillo
9		1.1.1.1.5	Asignar Autoridad y ...	0.5 days	03/10/25, 13:00	03/10/25, 17:00			0%	8	Adriel Rodrigez Brenes
10		**1.1.1.2**	**Lista de interesados**	**2.4 days**	**04/10/25, 08:00**	**07/10/25, 11:12**			**0 %**		
11		1.1.1.2.1	Analizar el Acta de C...	0.5 days	04/10/25, 08:00	04/10/25, 13:00			0%	9	Adriel Rodrigez Brenes
12		1.1.1.2.2	Consultar a expertos ...	0.5 days	04/10/25, 13:00	04/10/25, 17:00			0%	11	Alison Michell Castillo
13		1.1.1.2.3	Realizar el Análisis de ...	0.8 days	06/10/25, 08:00	06/10/25, 15:24			0%	12	Alison Michell Castillo
14		1.1.1.2.4	Documentar el Registro	0.6 days	06/10/25, 15:24	07/10/25, 11:12			0%	13	Adriel Rodrigez Brenes
15		**1.1.1.3**	**Estrategia de la gest...**	**2.4 days**	**07/10/25, 11:12**	**09/10/25, 15:24**			**0 %**		
16		1.1.1.3.1	Analizar el Plan para l...	0.5 days	07/10/25, 11:12	07/10/25, 16:12			0%	14	Adriel Rodrigez Brenes
17		1.1.1.3.2	Aplicar Técnicas Anal...	0.8 days	07/10/25, 16:12	08/10/25, 14:36			0%	16	Adriel Rodrigez Brenes
18		1.1.1.3.3	Consultar a expertos ...	0.5 days	08/10/25, 14:36	09/10/25, 09:36			0%	17	Alison Michell Castillo
19		1.1.1.3.4	Documentar la Estrat...	0.6 days	09/10/25, 09:36	09/10/25, 15:24			0%	18	Adriel Rodrigez Brenes
20		**1.1.1.4**	**Junta de entregables...**	**2.1 days**	**17/10/25, 15:24**	**20/10/25, 16:12**			**0 %**		
21		1.1.1.4.1	Revisar todos los doc...	0.7 days	17/10/25, 15:24	18/10/25, 13:00			0%	39	Alison Michell Castillo
22		1.1.1.4.2	Presentar cada uno ...	0.7 days	18/10/25, 13:00	20/10/25, 09:36			0%	21	Alison Michell Castillo
23		1.1.1.4.3	Validar que los entre...	0.7 days	20/10/25, 09:36	20/10/25, 16:12			0%	22	Adriel Rodrigez Brenes
24		**1.1.1.5**	**Organigrama**	**1.9 days**	**04/10/25, 08:00**	**06/10/25, 16:12**			**0 %**		
25		1.1.1.5.2	Definir Roles y Respo...	0.8 days	04/10/25, 08:00	04/10/25, 15:24			0%	9	Alison Michell Castillo
26		1.1.1.5.3	Aplicar la Teoría Org...	0.5 days	04/10/25, 15:24	06/10/25, 10:24			0%	25	Alison Michell Castillo
27		1.1.1.5.4	Consolidar en el Plan...	0.6 days	06/10/25, 10:24	06/10/25, 16:12			0%	26	Alison Michell Castillo
28		**1.1.1.6**	**Seguimiento y contr...**	**3.5 days**	**09/10/25, 15:24**	**14/10/25, 10:24**			**0 %**		
29		1.1.1.6.1	Reunir los Datos de ...	0.7 days	09/10/25, 15:24	10/10/25, 13:00			0%	19;27	
30		1.1.1.6.2	Elaboración de solicit...	0.7 days	10/10/25, 13:00	11/10/25, 09:36			0%	29	
31		1.1.1.6.3	Consultar a expertos ...	0.5 days	11/10/25, 09:36	11/10/25, 14:36			0%	30	
32		1.1.1.6.4	Evaluar cómo el cam...	0.8 days	11/10/25, 14:36	13/10/25, 13:00			0%	31	
33		1.1.1.6.5	Obtener la aprobació...	0.8 days	13/10/25, 13:00	14/10/25, 10:24			0%	32	
34		**1.1.1.7**	**Elaborar el informe ...**	**3.5 days**	**14/10/25, 10:24**	**17/10/25, 15:24**			**0 %**		
35		1.1.1.7.1	Recolectar datos de ...	0.7 days	14/10/25, 10:24	14/10/25, 17:00			0%	33	Alison Michell Castillo
36		1.1.1.7.2	Evaluar el desempeñ...	0.7 days	15/10/25, 08:00	15/10/25, 14:36			0%	35	Alison Michell Castillo
37		1.1.1.7.3	Analizar el progreso ...	0.7 days	15/10/25, 14:36	16/10/25, 11:12			0%	36	Adriel Rodrigez Brenes
38		1.1.1.7.4	Resumir el estado ge...	0.6 days	16/10/25, 11:12	17/10/25, 08:48			0%	37	Adriel Rodrigez Brenes
39		1.1.1.7.5	Crear gráficos que il...	0.7 days	17/10/25, 08:48	17/10/25, 15:24			0%	38	Adriel Rodrigez Brenes
40		**1.1.1.8**	**Acta de cierre de la ...**	**1.1 days**	**20/10/25, 16:12**	**21/10/25, 17:00**			**0 %**		
41		1.1.1.8.1	Recopilar todos los d...	0.3 days	20/10/25, 16:12	21/10/25, 09:36			0%	23	Alison Michell Castillo
42		1.1.1.8.2	Revisar los entregabl...	0.4 days	21/10/25, 09:36	21/10/25, 13:48			0%	41	Adriel Rodrigez Brenes
43		1.1.1.8.3	Elaborar el acta de ci...	0.4 days	21/10/25, 13:48	21/10/25, 17:00			0%	42	Alison Michell Castillo
44		**1.2**	**Planeación**	**43 days?**	**22/10/25, 08:00**	**10/12/25, 17:00**			**0 %**		
45		**1.2.1**	**Documentación de la e...**	**43 days?**	**22/10/25, 08:00**	**10/12/25, 17:00**			**0 %**		
46		**1.2.1.1**	**Plan de Gestión del ...**	**2.2 days**	**22/10/25, 08:00**	**24/10/25, 09:36**			**0 %**		
47		1.2.1.1.1	Reunir todos los planes	0.5 days	22/10/25, 08:00	22/10/25, 13:00			0%	43	Alison Michell Castillo
48		1.2.1.1.2	Consolidar todas las ...	0.7 days	22/10/25, 13:00	23/10/25, 09:36			0%	47	Adriel Rodrigez Brenes
49		1.2.1.1.3	Aplicar Juicio de Exp...	0.5 days	23/10/25, 09:36	23/10/25, 14:36			0%	48	Adriel Rodrigez Brenes
50		1.2.1.1.4	Obtener Aprobación...	0.5 days	23/10/25, 14:36	24/10/25, 09:36			0%	49	Adriel Rodrigez Brenes
51		**1.2.1.2**	**Plan de Gestión de c...**	**2.5 days**	**24/10/25, 09:36**	**27/10/25, 14:36**			**0 %**		
52		1.2.1.2.1	Determinar el nivel d...	0.5 days	24/10/25, 09:36	24/10/25, 14:36			0%	50	Alison Michell Castillo
53		1.2.1.2.2	Acordar con el equip...	0.5 days	24/10/25, 14:36	25/10/25, 09:36			0%	52	Adriel Rodrigez Brenes
54		1.2.1.2.3	Describir en detalle lo...	0.5 days	25/10/25, 09:36	25/10/25, 14:36			0%	53	Alison Michell Castillo
55		1.2.1.2.4	Documentar cómo se ...	0.5 days	25/10/25, 14:36	27/10/25, 09:36			0%	54	Adriel Rodrigez Brenes
56		1.2.1.2.5	Definir el Comité de ...	0.5 days	27/10/25, 09:36	27/10/25, 14:36			0%	55	Adriel Rodrigez Brenes
57		**1.2.1.3**	**Plan de gestión de la...**	**2.5 days**	**27/10/25, 14:36**	**30/10/25, 09:36**			**0 %**		
58		1.2.1.3.1	Determinar el nivel d...	0.5 days	27/10/25, 14:36	28/10/25, 09:36			0%	56	Alison Michell Castillo
59		1.2.1.3.2	Definir cómo se ident...	0.5 days	28/10/25, 09:36	28/10/25, 14:36			0%	58	Adriel Rodrigez Brenes
60		1.2.1.3.3	Definir las herramient...	0.5 days	28/10/25, 14:36	29/10/25, 09:36			0%	59	Adriel Rodrigez Brenes
61		1.2.1.3.4	Establecer cómo se v...	0.5 days	29/10/25, 09:36	29/10/25, 14:36			0%	60	Adriel Rodrigez Brenes
62		1.2.1.3.5	Documentar el Proceso	0.5 days	29/10/25, 14:36	30/10/25, 09:36			0%	61	Alison Michell Castillo
63		**1.2.1.4**	**Plan de Gestión de A...**	**2 days**	**30/10/25, 09:36**	**01/11/25, 09:36**			**0 %**		
64		1.2.1.4.1	Consultar a expertos ...	0.5 days	30/10/25, 09:36	30/10/25, 14:36			0%	62	Alison Michell Castillo
65		1.2.1.4.2	Sostener reuniones c...	0.5 days	30/10/25, 14:36	31/10/25, 09:36			0%	64	Alison Michell Castillo
66		1.2.1.4.3	Documentar el proce...	0.5 days	31/10/25, 09:36	31/10/25, 14:36			0%	65	Alison Michell Castillo
67		1.2.1.4.4	Documentar cómo se ...	0.5 days	31/10/25, 14:36	01/11/25, 09:36			0%	66	Adriel Rodrigez Brenes
68		**1.2.1.5**	**Plan de Gestión de R...**	**2.5 days**	**01/11/25, 09:36**	**04/11/25, 14:36**			**0 %**		
69		1.2.1.5.1	Consultar a expertos ...	0.5 days	01/11/25, 09:36	01/11/25, 14:36			0%	67	Alison Michell Castillo
70		1.2.1.5.2	Definir las Actividade...	0.5 days	01/11/25, 14:36	03/11/25, 09:36			0%	69	Alison Michell Castillo
71		1.2.1.5.3	Definir la Gestión de l...	0.5 days	03/11/25, 09:36	03/11/25, 14:36			0%	70	Adriel Rodrigez Brenes
72		1.2.1.5.4	Definir el Proceso de ...	0.5 days	03/11/25, 14:36	04/11/25, 09:36			0%	71	Alison Michell Castillo
73		1.2.1.5.5	Definir qué atributos ...	0.5 days	04/11/25, 09:36	04/11/25, 14:36			0%	72	Adriel Rodrigez Brenes
74		**1.2.1.6**	**Documentación de R...**	**2 days**	**04/11/25, 14:36**	**06/11/25, 14:36**			**0 %**		
75		1.2.1.6.1	Consultar a expertos ...	0.5 days	04/11/25, 14:36	05/11/25, 09:36			0%	73	Alison Michell Castillo
76		1.2.1.6.2	Desarrollar Prototipos	0.5 days	05/11/25, 09:36	05/11/25, 14:36			0%	75	Adriel Rodrigez Brenes
77		1.2.1.6.3	Aplicar Técnicas Gru...	0.5 days	05/11/25, 14:36	06/11/25, 09:36			0%	76	Alison Michell Castillo
78		1.2.1.6.4	Realizar Análisis de D...	0.5 days	06/11/25, 09:36	06/11/25, 14:36			0%	77	Adriel Rodrigez Brenes
79		**1.2.1.7**	**Matriz de Trazabilid...**	**2 days**	**06/11/25, 14:36**	**08/11/25, 14:36**			**0 %**		
80		1.2.1.7.1	Definir Atributos de ...	0.5 days	06/11/25, 14:36	07/11/25, 09:36			0%	78	Alison Michell Castillo
81		1.2.1.7.2	Vincular Requisitos al...	0.5 days	07/11/25, 09:36	07/11/25, 14:36			0%	80	Adriel Rodrigez Brenes
82		1.2.1.7.3	Vincular Requisitos al...	0.5 days	07/11/25, 14:36	08/11/25, 09:36			0%	81	Alison Michell Castillo
83		1.2.1.7.4	Vincular Requisitos a ...	0.5 days	08/11/25, 09:36	08/11/25, 14:36			0%	82	Adriel Rodrigez Brenes
84		**1.2.1.8**	**Declaración del Alca...**	**2.5 days**	**08/11/25, 14:36**	**12/11/25, 09:36**			**0 %**		
85		1.2.1.8.1	Seleccionar los Requi...	0.5 days	08/11/25, 14:36	10/11/25, 09:36			0%	83	Alison Michell Castillo
86		1.2.1.8.2	Traducir los requisito...	0.5 days	10/11/25, 09:36	10/11/25, 14:36			0%	85	Adriel Rodrigez Brenes
87		1.2.1.8.3	Reunir a los interesad...	0.5 days	10/11/25, 14:36	11/11/25, 09:36			0%	86	Adriel Rodrigez Brenes
88		1.2.1.8.4	Documentar los Com...	0.5 days	11/11/25, 09:36	11/11/25, 14:36			0%	87	Adriel Rodrigez Brenes
89		1.2.1.8.5	Definir Límites Explícit...	0.5 days	11/11/25, 14:36	12/11/25, 09:36			0%	88	Alison Michell Castillo
90		**1.2.1.9**	**EDT o WBS del Proy...**	**2 days**	**12/11/25, 09:36**	**14/11/25, 09:36**			**0 %**		
91		1.2.1.9.1	Tomar los entregable...	0.5 days	12/11/25, 09:36	12/11/25, 14:36			0%	89	Adriel Rodrigez Brenes
92		1.2.1.9.2	Identificar los Paquet...	0.5 days	12/11/25, 14:36	13/11/25, 09:36			0%	91	Alison Michell Castillo
93		1.2.1.9.3	Consultar a expertos ...	0.5 days	13/11/25, 09:36	13/11/25, 14:36			0%	92	Alison Michell Castillo
94		1.2.1.9.4	Asignar Identificadores	0.5 days	13/11/25, 14:36	14/11/25, 09:36			0%	93	Adriel Rodrigez Brenes
95		**1.2.1.10**	**Diccionario de la ED...**	**1.5 days?**	**14/11/25, 09:36**	**15/11/25, 14:36**			**0 %**		
96		1.2.1.10.1	Documentar la infor...	0.5 days	14/11/25, 09:36	14/11/25, 14:36			0%	94	Alison Michell Castillo
97		1.2.1.10.2	Crear el Diccionario ...	1 day?	14/11/25, 14:36	15/11/25, 14:36			0%	96	Alison Michell Castillo
98		**1.2.1.11**	**Diagrama de Red del...**	**3.2 days**	**15/11/25, 14:36**	**19/11/25, 16:12**			**0 %**		
99		1.2.1.11.1	Desglosar los paquet...	0.5 days	15/11/25, 14:36	17/11/25, 09:36			0%	97	Adriel Rodrigez Brenes
100		1.2.1.11.2	Aplicar el Método de ...	0.5 days	17/11/25, 09:36	17/11/25, 14:36			0%	99	Adriel Rodrigez Brenes
101		1.2.1.11.3	Determinar las Depen...	1 day	17/11/25, 14:36	18/11/25, 14:36			0%	100	Adriel Rodrigez Brenes
102		1.2.1.11.4	Establecer el tipo de ...	0.7 days	18/11/25, 14:36	19/11/25, 11:12			0%	101	Alison Michell Castillo
103		1.2.1.11.5	Ajustar la secuencia ...	0.5 days	19/11/25, 11:12	19/11/25, 16:12			0%	102	Alison Michell Castillo
104		**1.2.1.12**	**Estimación de Recur...**	**1.5 days**	**19/11/25, 16:12**	**21/11/25, 11:12**			**0 %**		
105		1.2.1.12.1	Consultar a expertos ...	0.5 days	19/11/25, 16:12	20/11/25, 11:12			0%	103	Alison Michell Castillo
106		1.2.1.12.2	Estimación por Tres ...	0.5 days	20/11/25, 11:12	20/11/25, 16:12			0%	105	Alison Michell Castillo
107		1.2.1.12.3	Estimación Paramétrica	0.5 days	20/11/25, 16:12	21/11/25, 11:12			0%	106	Adriel Rodrigez Brenes
108		**1.2.1.13**	**Cronograma del Pro...**	**3.4 days**	**21/11/25, 11:12**	**25/11/25, 15:24**			**0 %**		
109		1.2.1.13.1	Realizar Análisis de la ...	1 day	21/11/25, 11:12	22/11/25, 11:12			0%	107	Alison Michell Castillo
110		1.2.1.13.2	Aplicar el Método de ...	0.5 days	22/11/25, 11:12	22/11/25, 16:12			0%	109	Adriel Rodrigez Brenes
111		1.2.1.13.3	Aplicar Técnicas de ...	0.6 days	22/11/25, 16:12	24/11/25, 13:00			0%	110	Adriel Rodrigez Brenes
112		1.2.1.13.4	Aplicar Técnicas de ...	0.8 days	24/11/25, 13:00	25/11/25, 10:24			0%	111	Adriel Rodrigez Brenes
113		1.2.1.13.5	Generar el Cronogra...	0.5 days	25/11/25, 10:24	25/11/25, 15:24			0%	112	Adriel Rodrigez Brenes
114		**1.2.1.14**	**Costo del Proyecto**	**2.7 days**	**25/11/25, 15:24**	**28/11/25, 13:00**			**0 %**		
115		1.2.1.14.1	Aplicar Estimación A...	0.5 days	25/11/25, 15:24	26/11/25, 10:24			0%	113	Alison Michell Castillo
116		1.2.1.14.2	Aplicar Estimación p...	0.5 days	26/11/25, 10:24	26/11/25, 15:24			0%	115	Alison Michell Castillo
117		1.2.1.14.3	Realizar Análisis de R...	0.5 days	26/11/25, 15:24	27/11/25, 10:24			0%	116	Alison Michell Castillo
118		1.2.1.14.4	Considerar el Costo ...	0.7 days	27/11/25, 10:24	27/11/25, 17:00			0%	117	Alison Michell Castillo
119		1.2.1.14.5	Documentar la Base ...	0.5 days	28/11/25, 08:00	28/11/25, 13:00			0%	118	Alison Michell Castillo
120		**1.2.1.15**	**Presupuesto del Pro...**	**2 days**	**28/11/25, 13:00**	**01/12/25, 13:00**			**0 %**		
121		1.2.1.15.1	Realizar la Agregació...	0.5 days	28/11/25, 13:00	28/11/25, 17:00			0%	119	Adriel Rodrigez Brenes
122		1.2.1.15.2	Realizar Análisis de R...	0.5 days	29/11/25, 08:00	29/11/25, 13:00			0%	121	Adriel Rodrigez Brenes
123		1.2.1.15.3	Conciliar el Límite de ...	0.5 days	29/11/25, 13:00	29/11/25, 17:00			0%	122	Adriel Rodrigez Brenes
124		1.2.1.15.4	Documentar los Req...	0.5 days	01/12/25, 08:00	01/12/25, 13:00			0%	123	Alison Michell Castillo
125		**1.2.1.18**	**Acta de cierre de la ...**	**2 days**	**01/12/25, 13:00**	**03/12/25, 13:00**			**0 %**		
126		1.2.1.18.1	Revisar los Criterios ...	0.5 days	01/12/25, 13:00	01/12/25, 17:00			0%	124	Adriel Rodrigez Brenes
127		1.2.1.18.2	Revisar los entregabl...	0.5 days	02/12/25, 08:00	02/12/25, 13:00			0%	126	Adriel Rodrigez Brenes
128		1.2.1.18.3	Elaborar el acta de ci...	0.5 days	02/12/25, 13:00	02/12/25, 17:00			0%	127	Adriel Rodrigez Brenes
129		1.2.1.18.4	Formalizar la Transfe...	0.5 days	03/12/25, 08:00	03/12/25, 13:00			0%	128	Adriel Rodrigez Brenes
130		**1.2.1.16**	**Seguimiento y contr...**	**3.3 days**	**03/12/25, 13:00**	**06/12/25, 15:24**			**0 %**		
131		1.2.1.16.1	Reunir los Datos de ...	0.6 days	03/12/25, 13:00	04/12/25, 08:48			0%	129	Adriel Rodrigez Brenes
132		1.2.1.16.2	Elaboración de solicit...	0.8 days	04/12/25, 08:48	04/12/25, 16:12			0%	131	Adriel Rodrigez Brenes
133		1.2.1.16.3	Consultar a expertos ...	0.7 days	04/12/25, 16:12	05/12/25, 13:48			0%	132	Adriel Rodrigez Brenes
134		1.2.1.16.4	Evaluar cómo el cam...	0.7 days	05/12/25, 13:48	06/12/25, 10:24			0%	133	Alison Michell Castillo
135		1.2.1.16.5	Obtener la aprobació...	0.5 days	06/12/25, 10:24	06/12/25, 15:24			0%	134	Adriel Rodrigez Brenes
136		**1.2.1.17**	**Elaborar el informe ...**	**3.2 days**	**06/12/25, 15:24**	**10/12/25, 17:00**			**0 %**		
137		1.2.1.17.1	Recolectar datos de ...	0.5 days	06/12/25, 15:24	08/12/25, 10:24			0%	135	Alison Michell Castillo
138		1.2.1.17.2	Evaluar el desempeñ...	0.5 days	08/12/25, 10:24	08/12/25, 15:24			0%	137	Alison Michell Castillo
139		1.2.1.17.3	Analizar el progreso ...	1 day	08/12/25, 15:24	09/12/25, 15:24			0%	138	Alison Michell Castillo
140		1.2.1.17.4	Resumir el estado ge...	0.5 days	09/12/25, 15:24	10/12/25, 10:24			0%	139	Alison Michell Castillo
141		1.2.1.17.5	Crear gráficos que il...	0.7 days	10/12/25, 10:24	10/12/25, 17:00			0%	140	Adriel Rodrigez Brenes
142		**1.3**	**Ejecución**	**79 days?**	**11/12/25, 08:00**	**12/03/26, 17:00**			**0 %**		
143		**1.3.1**	**Documentación de la e...**	**79 days?**	**11/12/25, 08:00**	**12/03/26, 17:00**			**0 %**		
144		**1.3.1.1**	**Plan de Gestión del ...**	**13.6 days?**	**11/12/25, 08:00**	**26/12/25, 13:48**			**0 %**		
145		1.3.1.1.1	Identificar la Necesid...	2.5 days?	11/12/25, 08:00	13/12/25, 13:00			0%	141	Alison Michell Castillo
146		1.3.1.1.2	Procesar el Cambio	2.6 days	13/12/25, 13:00	17/12/25, 08:48			0%	145	Adriel Rodrigez Brenes
147		1.3.1.1.3	Consultar a expertos ...	3 days	17/12/25, 08:48	20/12/25, 08:48			0%	146	Adriel Rodrigez Brenes
148		1.3.1.1.4	Recibir la aprobación...	2.5 days	20/12/25, 08:48	23/12/25, 13:48			0%	147	Alison Michell Castillo
149		1.3.1.1.5	Actualizar Formalme...	3 days	23/12/25, 13:48	26/12/25, 13:48			0%	148	Adriel Rodrigez Brenes
150		**1.3.1.2**	**Junta de Entregables...**	**10 days**	**26/12/25, 13:48**	**07/01/26, 13:48**			**0 %**		
151		1.3.1.2.1	Obtener los "Entrega...	2.5 days	26/12/25, 13:48	30/12/25, 08:48			0%	149	Adriel Rodrigez Brenes
152		1.3.1.2.2	Preparar la Documen...	2.5 days	30/12/25, 08:48	01/01/26, 13:48			0%	151	Alison Michell Castillo
153		1.3.1.2.3	Aplicar Técnicas Gru...	2.5 days	01/01/26, 13:48	05/01/26, 08:48			0%	152	Alison Michell Castillo
154		1.3.1.2.4	Documentar los Resu...	2.5 days	05/01/26, 08:48	07/01/26, 13:48			0%	153	Alison Michell Castillo
155		**1.3.1.3**	**Seguimiento y control**	**44.9 days**	**07/01/26, 13:48**	**28/02/26, 13:00**			**0 %**		
156		**1.3.1.3.1**	**Solicitud de Cambio**	**10 days**	**07/01/26, 13:48**	**19/01/26, 13:48**			**0 %**		
157		1.3.1.3.1.1	Generar Datos de ...	2.5 days	07/01/26, 13:48	10/01/26, 08:48			0%	154	Adriel Rodrigez Brenes
158		1.3.1.3.1.2	Evaluar el desempe...	2.5 days	10/01/26, 08:48	13/01/26, 13:48			0%	157	Adriel Rodrigez Brenes
159		1.3.1.3.1.3	Identificar la Necesi...	2.5 days	13/01/26, 13:48	16/01/26, 08:48			0%	158	Adriel Rodrigez Brenes
160		1.3.1.3.1.4	Documentar la Soli...	2.5 days	16/01/26, 08:48	19/01/26, 13:48			0%	159	Alison Michell Castillo
161		**1.3.1.3.2**	**Informe de Desem...**	**10.7 days**	**19/01/26, 13:48**	**31/01/26, 10:24**			**0 %**		
162		1.3.1.3.2.1	Identificar qué se d...	2.7 days	19/01/26, 13:48	22/01/26, 10:24			0%	160	Alison Michell Castillo
163		1.3.1.3.2.2	Revisar los Informe...	2.5 days	22/01/26, 10:24	24/01/26, 15:24			0%	162	Alison Michell Castillo
164		1.3.1.3.2.3	Recopilar y distribu...	2.5 days	24/01/26, 15:24	28/01/26, 10:24			0%	163	Adriel Rodrigez Brenes
165		1.3.1.3.2.4	Generar la "Comuni...	3 days	28/01/26, 10:24	31/01/26, 10:24			0%	164	Alison Michell Castillo
166		**1.3.1.3.3**	**Reunión de Control...**	**12.5 days**	**31/01/26, 10:24**	**14/02/26, 15:24**			**0 %**		
167		1.3.1.3.3.1	Preparar la Reunión	3 days	31/01/26, 10:24	04/02/26, 10:24			0%	165	Adriel Rodrigez Brenes
168		1.3.1.3.3.2	Ejecutar la Reunión	2.5 days	04/02/26, 10:24	06/02/26, 15:24			0%	167	Adriel Rodrigez Brenes
169		1.3.1.3.3.3	Facilitar activament...	2.5 days	06/02/26, 15:24	10/02/26, 10:24			0%	168	Alison Michell Castillo
170		1.3.1.3.3.4	Usar plantillas de a...	2 days	10/02/26, 10:24	12/02/26, 10:24			0%	169	Alison Michell Castillo;Adriel Ro...
171		1.3.1.3.3.5	Generar y Distribui...	2.5 days	12/02/26, 10:24	14/02/26, 15:24			0%	170	Alison Michell Castillo
172		**1.3.1.3.4**	**Evaluación de Com...**	**11.7 days**	**14/02/26, 15:24**	**28/02/26, 13:00**			**0 %**		
173		1.3.1.3.4.1	Realizar actividades...	1.2 days	14/02/26, 15:24	16/02/26, 17:00			0%	171	Alison Michell Castillo
174		1.3.1.3.4.2	Realizar Actividade...	3 days	17/02/26, 08:00	19/02/26, 17:00			0%	173	Alison Michell Castillo
175		1.3.1.3.4.3	Aplicar Reconocimi...	2.5 days	20/02/26, 08:00	23/02/26, 13:00			0%	174	Alison Michell Castillo
176		1.3.1.3.4.4	Utilizar Herramienta...	2.5 days	23/02/26, 13:00	25/02/26, 17:00			0%	175	Alison Michell Castillo
177		1.3.1.3.4.5	Generar las Evalua...	2.5 days	26/02/26, 08:00	28/02/26, 13:00			0%	176	Alison Michell Castillo
178		**1.3.1.4**	**Acta de Cierre de la ...**	**10.5 days**	**28/02/26, 13:00**	**12/03/26, 17:00**			**0 %**		
179		1.3.1.4.1	Revisar los Criterios ...	2.5 days	28/02/26, 13:00	03/03/26, 17:00			0%	177	Adriel Rodrigez Brenes
180		1.3.1.4.2	Confirmar la Aceptac...	2.5 days	04/03/26, 08:00	06/03/26, 13:00			0%	179	Adriel Rodrigez Brenes
181		1.3.1.4.3	Utilizar el juicio de ex...	2.5 days	06/03/26, 13:00	09/03/26, 17:00			0%	180	Adriel Rodrigez Brenes
182		1.3.1.4.4	Formalizar el Cierre y...	3 days	10/03/26, 08:00	12/03/26, 17:00			0%	181	Adriel Rodrigez Brenes
183		**1.4**	**Cierre**	**17 days**	**13/03/26, 08:00**	**01/04/26, 17:00**			**0 %**		
184		**1.4.1**	**Documentación de la ...**	**17 days**	**13/03/26, 08:00**	**01/04/26, 17:00**			**0 %**		
185		**1.4.1.1**	**Junta de Entregables...**	**2.5 days**	**13/03/26, 08:00**	**16/03/26, 13:00**			**0 %**		
186		1.4.1.1.1	Recibir el producto fi...	0.5 days	13/03/26, 08:00	13/03/26, 13:00			0%	182	Alison Michell Castillo
187		1.4.1.1.2	Preparar la Documen...	0.5 days	13/03/26, 13:00	13/03/26, 17:00			0%	186	Alison Michell Castillo
188		1.4.1.1.3	Realizar la reunión fo...	0.5 days	14/03/26, 08:00	14/03/26, 13:00			0%	187	Adriel Rodrigez Brenes
189		1.4.1.1.4	Aplicar Técnicas Gru...	0.5 days	14/03/26, 13:00	14/03/26, 17:00			0%	188	Alison Michell Castillo
190		1.4.1.1.5	Documentar los Resu...	0.5 days	16/03/26, 08:00	16/03/26, 13:00			0%	189	Adriel Rodrigez Brenes
191		**1.4.1.2**	**Acta de Aceptación ...**	**2 days**	**16/03/26, 13:00**	**18/03/26, 13:00**			**0 %**		
192		1.4.1.2.1	Obtener la Aprobaci...	0.5 days	16/03/26, 13:00	16/03/26, 17:00			0%	190	Alison Michell Castillo
193		1.4.1.2.2	Formalizar la Aceptac...	0.5 days	17/03/26, 08:00	17/03/26, 13:00			0%	192	Alison Michell Castillo
194		1.4.1.2.3	Obtener la Firma del ...	0.5 days	17/03/26, 13:00	17/03/26, 17:00			0%	193	Adriel Rodrigez Brenes
195		1.4.1.2.4	Distribuir la Aceptaci...	0.5 days	18/03/26, 08:00	18/03/26, 13:00			0%	194	Alison Michell Castillo
196		**1.4.1.3**	**Gestión de Documen...**	**2.5 days**	**18/03/26, 13:00**	**20/03/26, 17:00**			**0 %**		
197		1.4.1.3.1	Revisar la Informació...	0.5 days	18/03/26, 13:00	18/03/26, 17:00			0%	195	Alison Michell Castillo
198		1.4.1.3.2	Realizar Reuniones d...	0.5 days	19/03/26, 08:00	19/03/26, 13:00			0%	197	Adriel Rodrigez Brenes
199		1.4.1.3.3	Archivar los Registro...	0.5 days	19/03/26, 13:00	19/03/26, 17:00			0%	198	Alison Michell Castillo
200		1.4.1.3.4	Documentar el Cierre...	0.5 days	20/03/26, 08:00	20/03/26, 13:00			0%	199	Alison Michell Castillo
201		1.4.1.3.5	Crear los "Archivos ...	0.5 days	20/03/26, 13:00	20/03/26, 17:00			0%	200	Alison Michell Castillo
202		**1.4.1.4**	**Informe de Desemp...**	**2.5 days**	**21/03/26, 08:00**	**24/03/26, 13:00**			**0 %**		
203		1.4.1.4.1	Recopilar la Informaci...	0.5 days	21/03/26, 08:00	21/03/26, 13:00			0%	201	Adriel Rodrigez Brenes
204		1.4.1.4.2	Aplicar Técnicas Anal...	0.5 days	21/03/26, 13:00	21/03/26, 17:00			0%	203	Alison Michell Castillo
205		1.4.1.4.3	Aplicar Juicio de Exp...	0.5 days	23/03/26, 08:00	23/03/26, 13:00			0%	204	Adriel Rodrigez Brenes
206		1.4.1.4.4	Generar Pronósticos ...	0.5 days	23/03/26, 13:00	23/03/26, 17:00			0%	205	Alison Michell Castillo
207		1.4.1.4.5	Compilar y Formatea...	0.5 days	24/03/26, 08:00	24/03/26, 13:00			0%	206	Adriel Rodrigez Brenes
208		**1.4.1.5**	**Reunión de Control d...**	**4 days**	**24/03/26, 13:00**	**28/03/26, 13:00**			**0 %**		
209		1.4.1.5.1	Preparar la Reunión	0.5 days	24/03/26, 13:00	24/03/26, 17:00			0%	207	Alison Michell Castillo
210		1.4.1.5.2	Ejecutar la Reunión	0.5 days	25/03/26, 08:00	25/03/26, 13:00			0%	209	Alison Michell Castillo
211		1.4.1.5.3	Aplicar Habilidades d...	1 day	25/03/26, 13:00	26/03/26, 13:00			0%	210	Alison Michell Castillo
212		1.4.1.5.4	Utilizar Sistemas de G...	1 day	26/03/26, 13:00	27/03/26, 13:00			0%	211	Alison Michell Castillo
213		1.4.1.5.5	Generar y Distribuir ...	1 day	27/03/26, 13:00	28/03/26, 13:00			0%	212	Adriel Rodrigez Brenes
214		**1.4.1.6**	**Acta de Cierre de la ...**	**3.5 days**	**28/03/26, 13:00**	**01/04/26, 17:00**			**0 %**		
215		1.4.1.6.1	Revisar toda la Docu...	1 day	28/03/26, 13:00	30/03/26, 13:00			0%	213	Alison Michell Castillo
216		1.4.1.6.2	Confirmar la Aceptac...	1 day	30/03/26, 13:00	31/03/26, 13:00			0%	215	Alison Michell Castillo
217		1.4.1.6.3	Asegurar el Cierre A...	0.5 days	31/03/26, 13:00	31/03/26, 17:00			0%	216	Alison Michell Castillo;Adriel Ro...
218		1.4.1.6.4	Realizar la Revisión Fi...	0.5 days	01/04/26, 08:00	01/04/26, 13:00			0%	217	Alison Michell Castillo
219		1.4.1.6.5	Formalizar el Cierre y...	0.5 days	01/04/26, 13:00	01/04/26, 17:00			0%	218	Alison Michell Castillo
220		**2**	**Ciclo de vida del producto**	**470 days?**	**01/10/25, 08:00**	**01/04/27, 17:00**			**0 %**		
221		**2.1**	**Planeación**	**8 days**	**01/10/25, 08:00**	**09/10/25, 17:00**			**0 %**		
222		2.1.1	Liderar reuniones de visi...	2 days	01/10/25, 08:00	02/10/25, 17:00			0%		Omar Lorenzo Pacheco
223		2.1.2	Identificar recursos (RRH...	2 days	03/10/25, 08:00	04/10/25, 17:00			0%	222	Omar Lorenzo Pacheco;Garrid...
224		2.1.3	Elaborar presupuesto ini...	2 days	06/10/25, 08:00	07/10/25, 17:00			0%	223	Omar Lorenzo Pacheco;Lapto...
225		2.1.4	Definir Alcance de Alto N...	2 days	08/10/25, 08:00	09/10/25, 17:00			0%	224	Omar Lorenzo Pacheco
226		**2.2**	**Análisis**	**17 days**	**10/10/25, 08:00**	**29/10/25, 17:00**			**0 %**		
227		2.2.1	Recopilar requisitos con ...	3 days	10/10/25, 08:00	13/10/25, 17:00			0%	225	Omar Lorenzo Pacheco
228		2.2.2	Documentar los requisito...	3 days	14/10/25, 08:00	16/10/25, 17:00			0%	227	Omar Lorenzo Pacheco
229		2.2.3	Entrevistas con los usuari...	3 days	17/10/25, 08:00	20/10/25, 17:00			0%	228	Garrido Reyes Jimena
230		2.2.4	Crear los user personas	3 days	21/10/25, 08:00	23/10/25, 17:00			0%	229	Garrido Reyes Jimena
231		2.2.5	Desarrollar los wireframes	3 days	24/10/25, 08:00	27/10/25, 17:00			0%	230	Garrido Reyes Jimena
232		2.2.6	Analizar los requisitos téc...	2 days	28/10/25, 08:00	29/10/25, 17:00			0%	231	Esteban Guillermo Morales
233		**2.3**	**Diseño**	**36 days**	**30/10/25, 08:00**	**10/12/25, 17:00**			**0 %**		
234		2.3.1	Definir la arquitectura de ...	6 days	30/10/25, 08:00	05/11/25, 17:00			0%	232	Omar Lorenzo Pacheco
235		2.3.2	Diseña la arquitectura de ...	6 days	06/11/25, 08:00	12/11/25, 17:00			0%	234	Esteban Guillermo Morales
236		2.3.3	Diseña la arquitectura del...	6 days	13/11/25, 08:00	19/11/25, 17:00			0%	235	Esteban Guillermo Morales
237		2.3.4	Crea los mockups	6 days	20/11/25, 08:00	26/11/25, 17:00			0%	236	Garrido Reyes Jimena
238		2.3.5	Diseña el style guide	6 days	27/11/25, 08:00	03/12/25, 17:00			0%	237	Garrido Reyes Jimena
239		2.3.6	Documentación de la arq...	6 days	04/12/25, 08:00	10/12/25, 17:00			0%	238	Samuel Dominguez Virelas
240		**2.4**	**Desarrollo**	**56.8 days**	**11/12/25, 08:00**	**14/02/26, 15:24**			**0 %**		
241		2.4.1	Configurar los entornos ...	8 days	11/12/25, 08:00	20/12/25, 17:00			0%	239	Omar Lorenzo Pacheco
242		2.4.2	Configura la VPN	9 days	22/12/25, 08:00	31/12/25, 17:00			0%	241	VPN;Omar Lorenzo Pacheco
243		2.4.3	Gestiona el repositorio de...	10.8 days	01/01/26, 08:00	13/01/26, 15:24			0%	242	Omar Lorenzo Pacheco
244		2.4.4	Desarrollar los compone...	9 days	13/01/26, 15:24	23/01/26, 15:24			0%	243	Esteban Guillermo Morales
245		2.4.5	Revisa el código (Code R...	10 days	23/01/26, 15:24	04/02/26, 15:24			0%	244	Esteban Guillermo Morales
246		2.4.6	Desarrolla todo el front-e...	9 days	04/02/26, 15:24	14/02/26, 15:24			0%	245	Garrido Reyes Jimena
247		**2.5**	**Implementación y Prueb...**	**31 days**	**14/02/26, 15:24**	**23/03/26, 15:24**			**0 %**		
248		2.5.1	Realizar pruebas	5 days	14/02/26, 15:24	20/02/26, 15:24			0%	246	Omar Lorenzo Pacheco
249		2.5.2	Gestionar el bug tracking	5 days	20/02/26, 15:24	26/02/26, 15:24			0%	248	Omar Lorenzo Pacheco
250		2.5.3	Gestionar las pruebas de in...	6 days	26/02/26, 15:24	05/03/26, 15:24			0%	249	Esteban Guillermo Morales
251		2.5.4	Realizar pruebas unitarias	5 days	05/03/26, 15:24	11/03/26, 15:24			0%	250	Samuel Dominguez Virelas
252		2.5.5	Pruebas de Aceptación d...	5 days	11/03/26, 15:24	17/03/26, 15:24			0%	251	Garrido Reyes Jimena
253		2.5.6	Realiza la capacitación a l...	5 days	17/03/26, 15:24	23/03/26, 15:24			0%	252	Garrido Reyes Jimena
254		**2.6**	**Entrega**	**7.6 days?**	**23/03/26, 15:24**	**01/04/26, 11:12**			**0 %**		
255		2.6.1	Ejecutar el plan de despli...	2 days	23/03/26, 15:24	25/03/26, 15:24			0%	253	Omar Lorenzo Pacheco
256		2.6.2	Realiza la entrega formal ...	2 days	25/03/26, 15:24	27/03/26, 15:24			0%	255	Omar Lorenzo Pacheco
257		2.6.3	Entrega de la documenta...	1.2 days	27/03/26, 15:24	28/03/26, 17:00			0%	256	Omar Lorenzo Pacheco
258		2.6.4	Dar soporte crítico duran...	1.2 days	30/03/26, 08:00	31/03/26, 09:36			0%	257	Esteban Guillermo Morales
259		2.6.5	Revisión visual final del si...	1.2 days?	31/03/26, 09:36	01/04/26, 11:12			0%	258	Garrido Reyes Jimena
260		**2.7**	**Mantenimiento**	**314 days?**	**01/04/26, 08:00**	**01/04/27, 17:00**			**0 %**		
261	▦	2.7.1	Supervisar el rendimient...	314 days?	01/04/26, 08:00	01/04/27, 17:00			0%		Omar Lorenzo Pacheco[20%]
262	▦	2.7.2	Gestionar la renovación ...	27 days?	01/10/26, 08:00	31/10/26, 17:00			0%		Licencias;Omar Lorenzo Pache...
263	▦	2.7.3	Gestionar la renovación ...	27 days?	01/10/26, 08:00	31/10/26, 17:00			0%		VPN;Omar Lorenzo Pacheco[5...
264	▦	2.7.4	Realizar correcciones de ...	314 days?	01/04/26, 08:00	01/04/27, 17:00			0%		Esteban Guillermo Morales[15%]
265	▦	2.4.5	Implementar pequeñas m...	314 days?	01/04/26, 08:00	01/04/27, 17:00			0%		Esteban Guillermo Morales[10%]
